

FASE 3.1 AFGESLOTEN WEEK 41 EN 46

FASE 3
wk 41 aanleggen persleiding (75m1)


FASE 4
wk 46 aanbrengen asfalt

FASE 3.2 AFGESLOTEN VANAF WEEK 41 T/M 46m (in delen)

FASE 3
wk 41/42/43 aanleggen persleiding (155m1), uitvoeren grondwerk/cunet en aanleg halfverharding (135m2)

FASE 3
wk 43 aanbrengen opsluitingen/goten (90m1)
Wk 44/45 aanbrengen straatwerk (135m2)

FASE 4
wk 46 aanbrengen asfalt

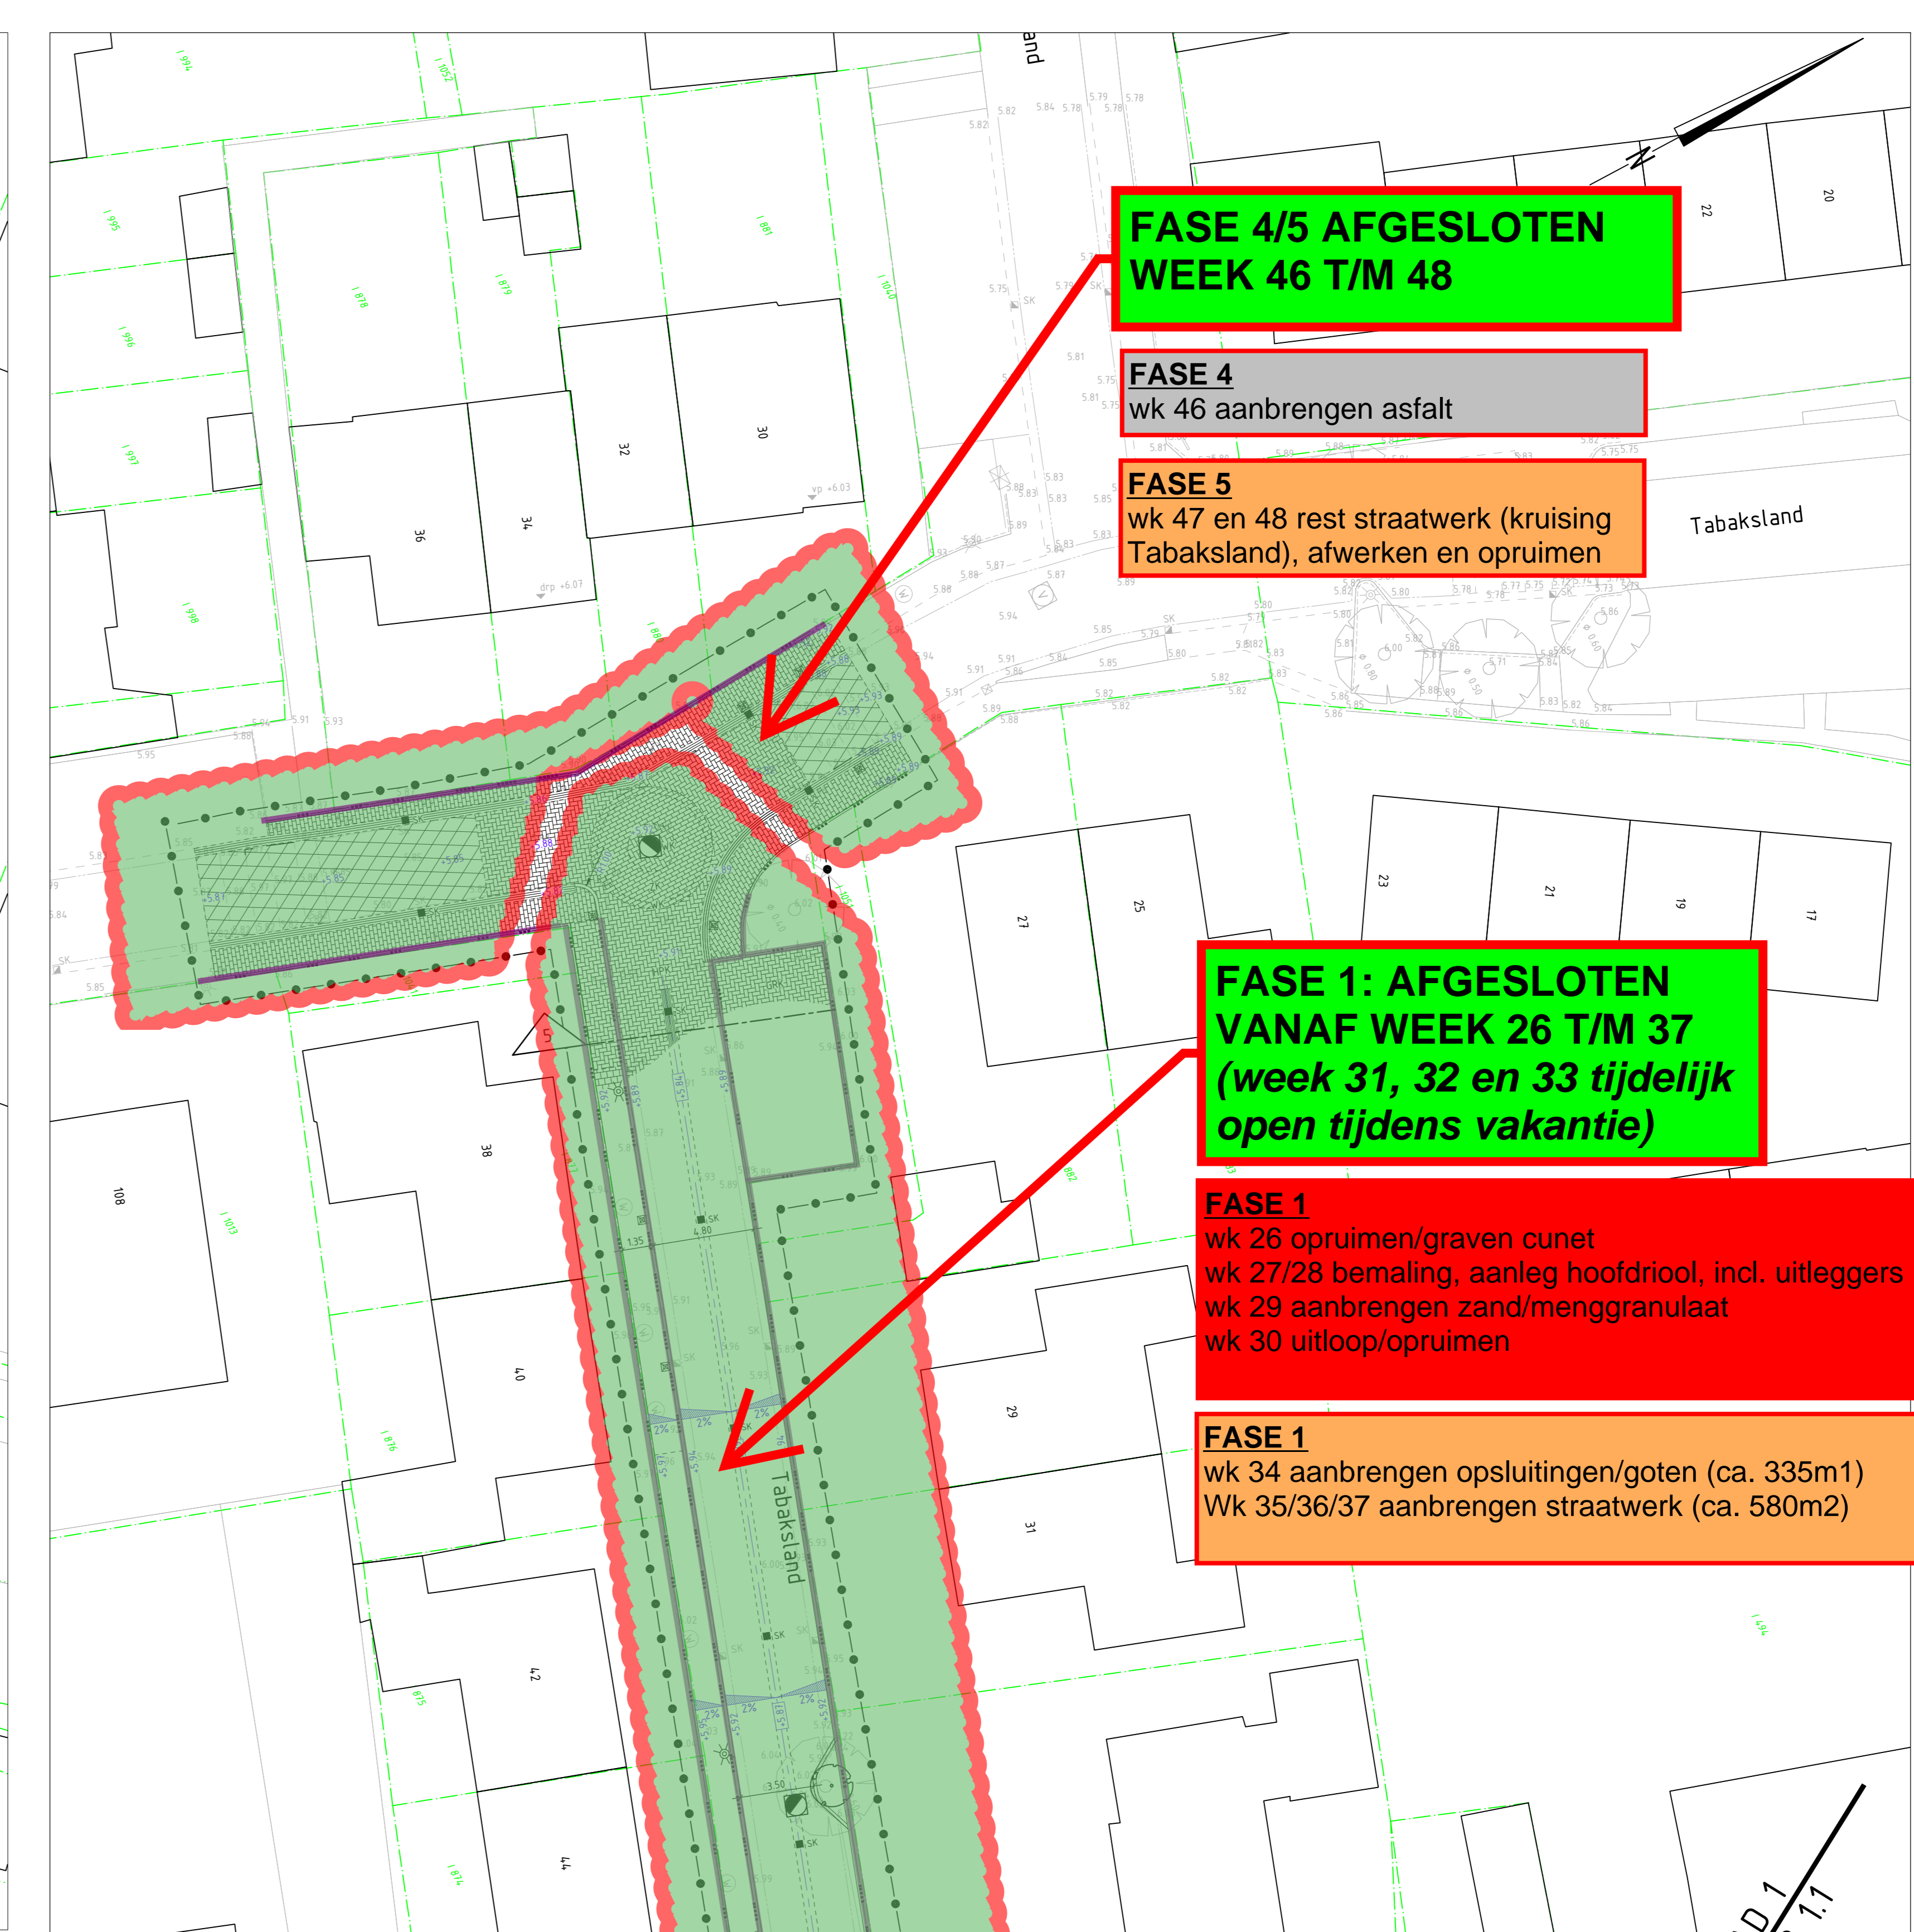

FASE 4/5 AFGESLOTEN WEEK 46 T/M 48


FASE 4
wk 46 aanbrengen asfalt

FASE 5
wk 47 en 48 rest straatwerk (kruising Tabaksland), afwerken en opruimen

FASE 1: AFGESLOTEN VANAF WEEK 26 T/M 37 (week 31, 32 en 33 tijdelijk open tijdens vakantie)

FASE 1
wk 26 opruimen/graven cunet
wk 27/28 bemaling, aanleg hoofdriool, incl. uitleggers
wk 29 aanbrengen zand/menggranulaat
wk 30 uitloop/opruimen

FASE 1
wk 34 aanbrengen opsluitingen/goten (ca. 335m1)
Wk 35/36/37 aanbrengen straatwerk (ca. 580m2)



FASE 2: AFGESLOTEN VANAF WEEK 34 T/M 46 (in delen)

FASE 2
wk 34 opruimen/graven cunet
wk 35/36/37 hoofdriool, incl. uitleggers
wk 38/39 aanbrengen zand/menggranulaat (ca.)
wk 40 uitloop/opruimen

FASE 2 (na vakantie)
wk 38/39/40 aanbrengen opsluitingen/goten (865m1)
wk 41/42 aanbrengen straatwerk (455m2)


FASE 4
wk 46 aanbrengen asfalt

OPSLAGTERREIN

RIOOLGEMAAL
wk 47

Legenda

- stroomslag - normale sigt 3-5mm
- asfalt, overlagen
- asfalt
- straatbakstenen Padva, of, kl. rood-brun, in keperverband
- betonstraatstenen, kl. kl. zwart, in elieboogverband
- betonstraatstenen, kl. kl. zwart, in halfsteensverband
- betonstraatstenen, kl. kl. zwart, in halfsteensverband
- betonstraatstenen, kl. kl. zwart, in halfsteensverband
- hulsgot, betonstraatstenen, kl. kl. grjs, halfsteensverband
- hulsgot, betonstraatstenen, of, kl. heldpaars, halfsteensverband
- betonstraatstenen, kl. kl. grjs, in halfsteensverband
- betonstraatstenen, kl. kl. grjs, in elieboogverband
- betontegels 300x300x50mm, kl. grjs, in halfsteensverband
- straatbakstenen, w, kl. rood-brun, in halfsteensverband
- straatbakstenen, kl. kl. rood, in halfsteensverband
- betonstraatstenen, kl. kl. heldpaars, in elieboogverband
- geleideband 140/55x200mm
- truitroband 130/150x200mm
- opsluitband 150x200mm
- opsluitband 100x200mm
- materialischeding
- as, rijkzaam
- hoogte weg
- ontwerphoogte
- afschot
- valuischrepen
- verkeersdrempel (gcm) conct 175x100mm
- straatverharding met gaas
- 3rd met 2 gaten
- straatkolk
- truitroband
- rioolband
- DWA inspectieput beton
- DWA inspectieput kunststof
- DWA uitstrook
- bestaande DWA inspectieput
- peristieding Ø100mm
- terreinaand opbouw
- kunststof dekantoplaad
- afvalbak
- uitloop
- profielgip
- boom

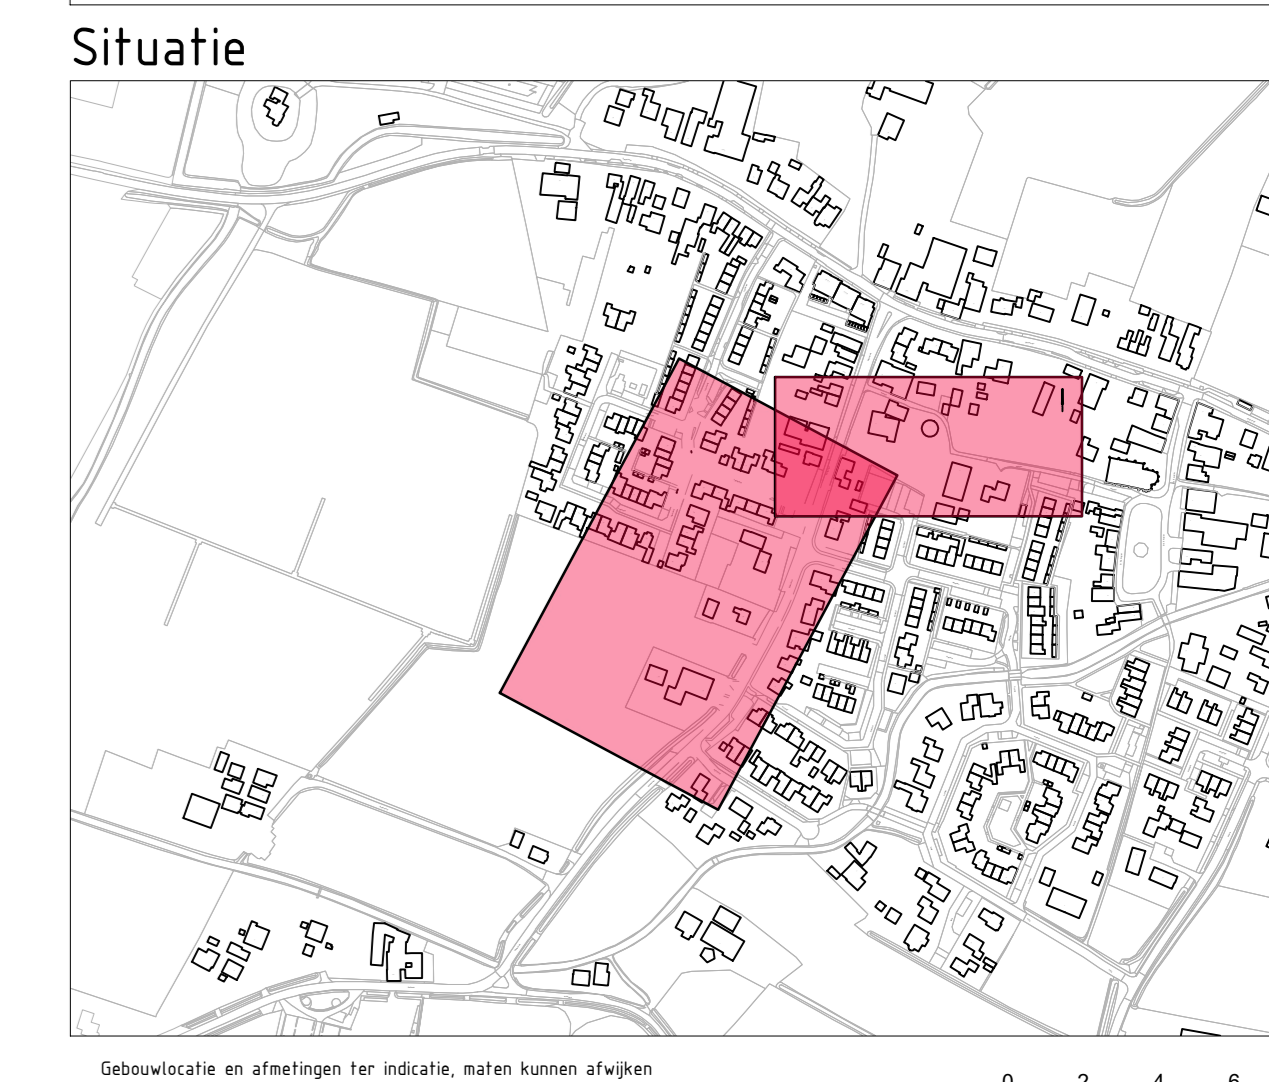

ADCM Adviesbureau voor Civiele techniek, Infrastructuur en Milieu

Rioolvergroting Tabaksland en Molensstraat te Ingen

Gemeente Buren

Situatie te maken werk

Definitief

Rev.	Wijziging	Dat.	Get.	Aci.	Projectleider	Tekeningmaker	Formaat
1	aanbrengen	15-10-2024	05	001	L2020013	L2020013	A4
2	aanbrengen	15-10-2024	05	001	L2020013	L2020013	A4
3	aanbrengen	15-10-2024	05	001	L2020013	L2020013	A4
4	aanbrengen	15-10-2024	05	001	L2020013	L2020013	A4
5	aanbrengen	15-10-2024	05	001	L2020013	L2020013	A4
